


Phasage déchargement/enfouissement :

- Phase A :
 - On décharge en 0 pour enfouir en 1
 - Lorsque 1 est plein, on l'utilise pour déchargé et enfouir en 2
- Phase B :
 - On décharge en 3 pour enfouir en 4
 - Lorsque 4 est plein, on l'utilise pour déchargé et enfouir en 5
- Phase C :
 - On décharge en 3 pour enfouir en 6
 - Lorsque 6 est plein, on l'utilise pour déchargé et enfouir en 7
- Phase D :
 - On décharge en 6 pour enfouir en 8

Les parties de la zone d'enfouissement extérieures au plan de phasage seront réaménagées pour le nivellement final.

Zone de tests de lixiviation :

- Phase A : Test en zone 0
- Phase B : Test en zone 3
- Phase C : Test en zone 3
- Phase D : Test en zone 6

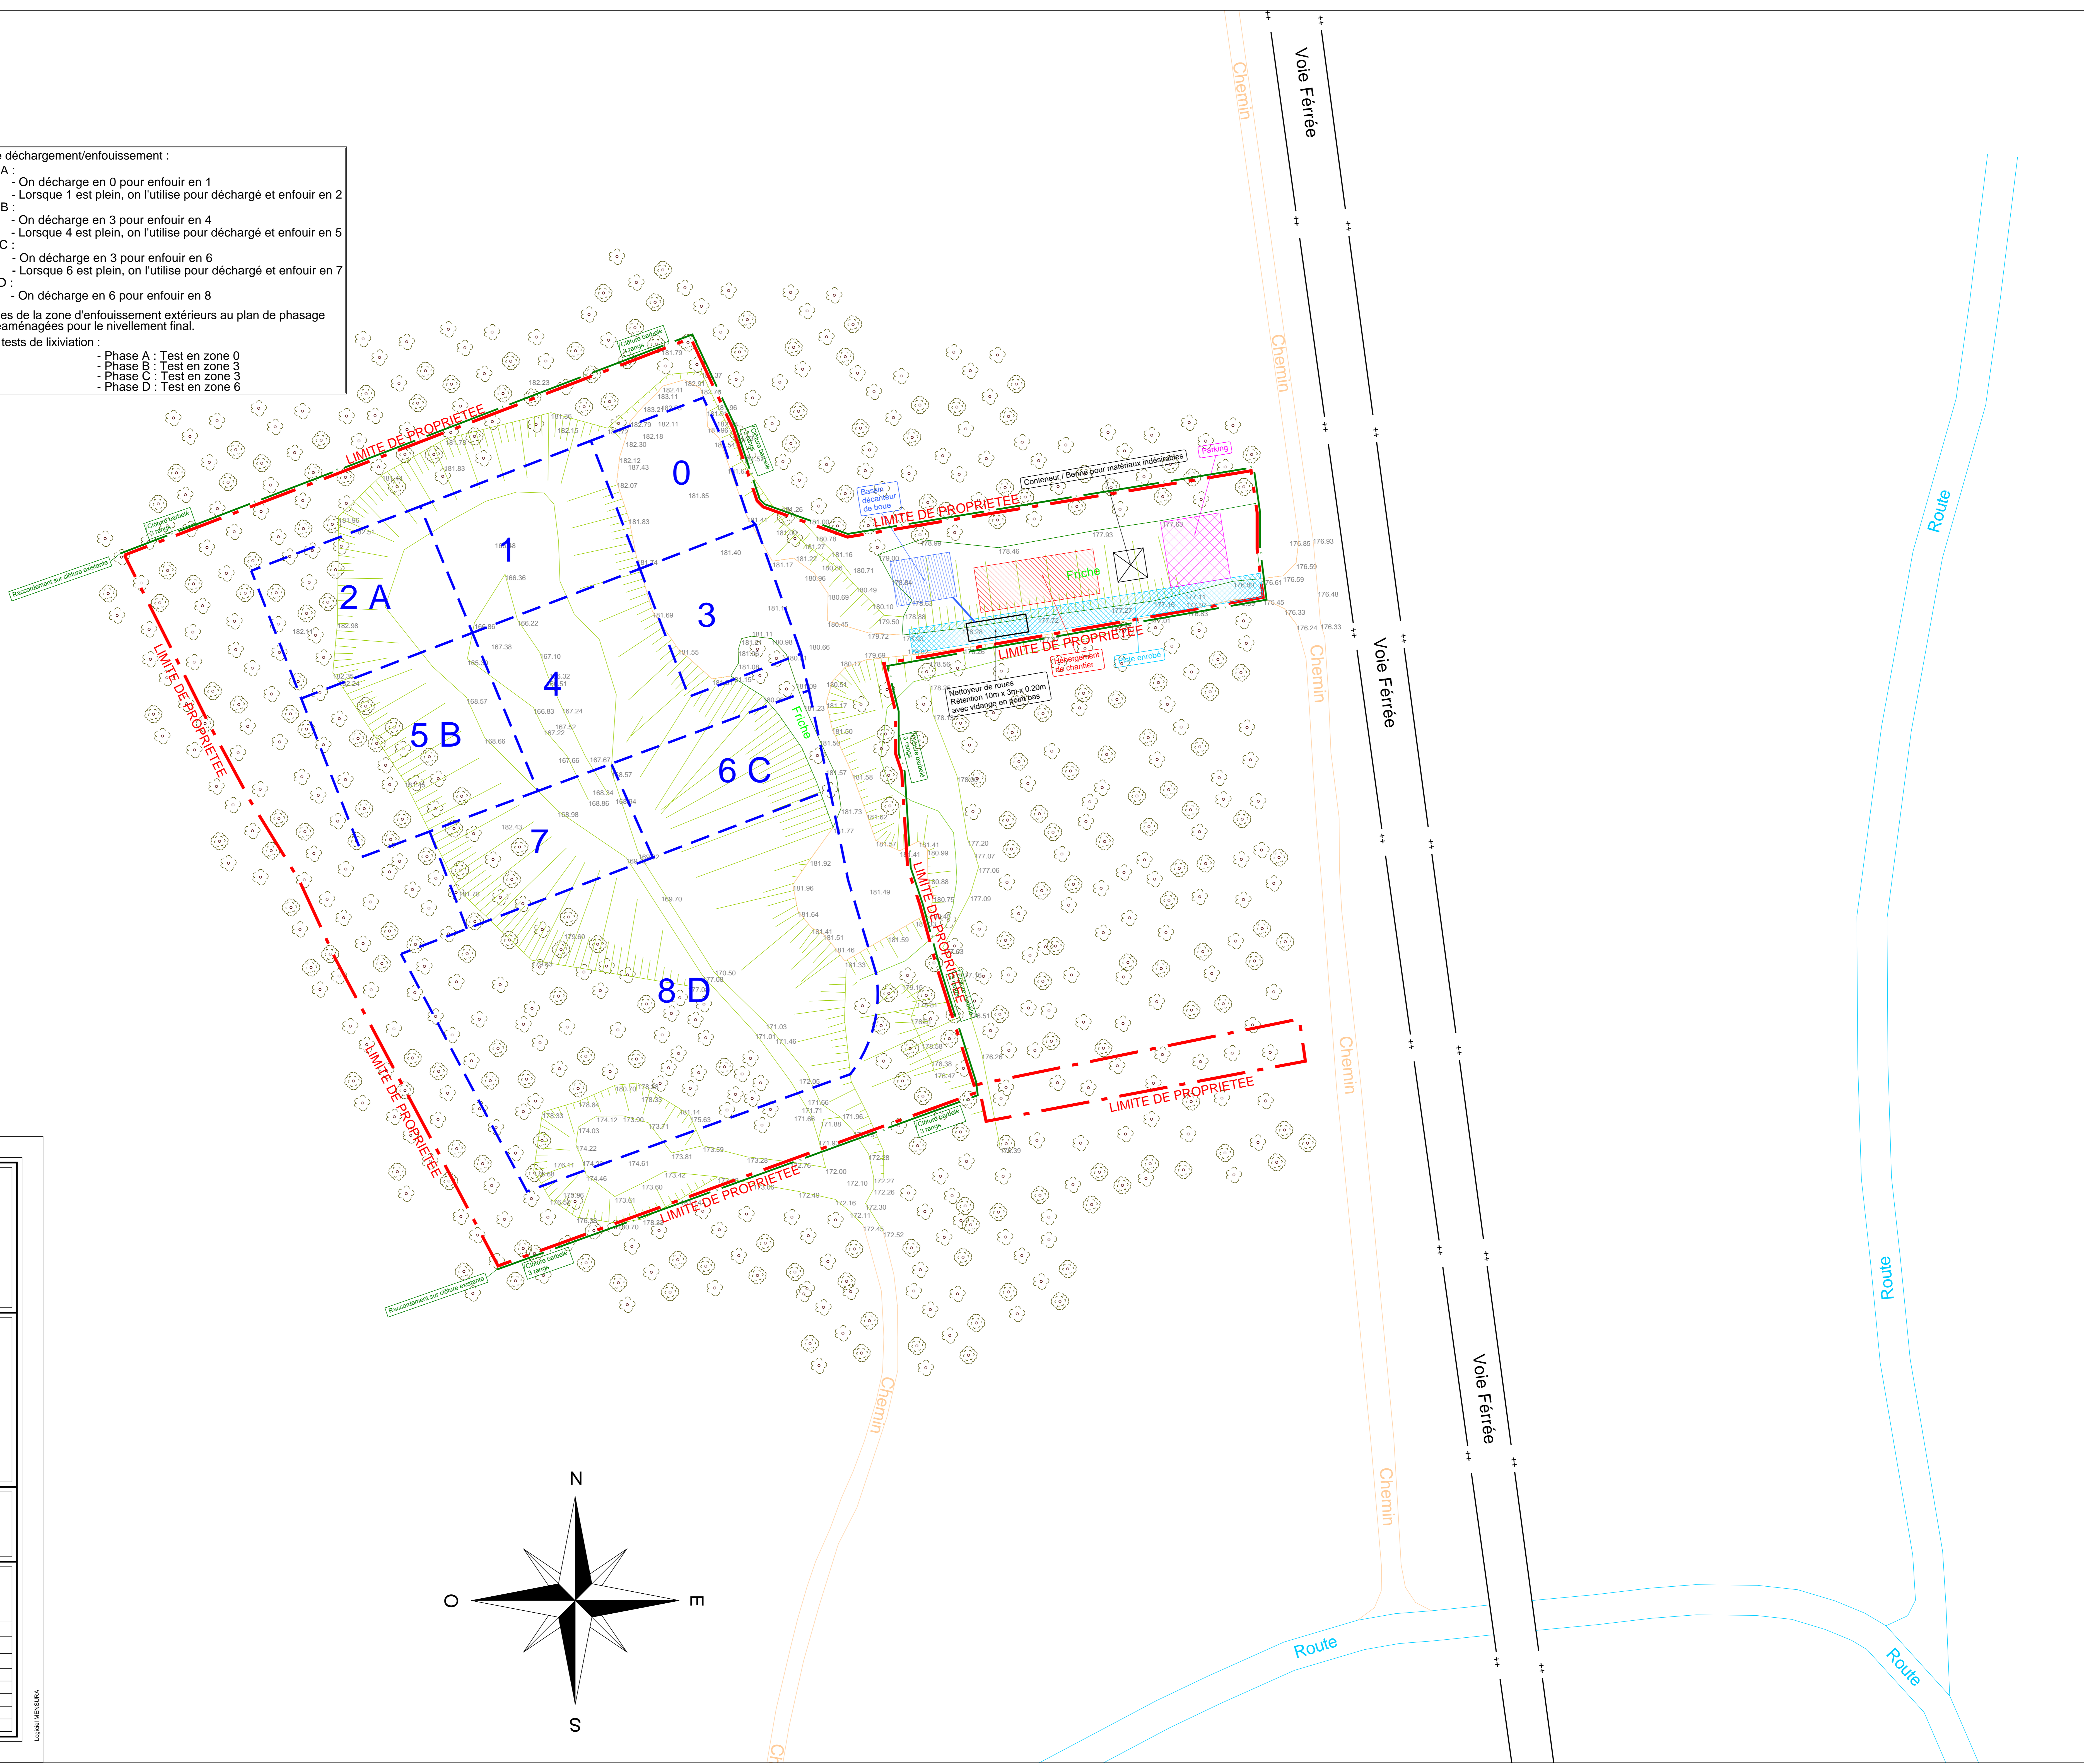

RN7
58400 MESVES SUR LOIRE
Tél : 03.86.69.23.16 Fax : 03.86.69.28.31

PROJET ISDI
-
MESVES SUR LOIRE

PLAN MASSE

PLAN DE PHASAGE

Echelle :	Date :	Établi par :
1/350	10/09/2019	N.GIROUX
Indice	Date	Objet
001	30/07	INITIAL
002	01/08	MODIFICATION DIVERSES
003	10/09	MODIFICATION DIVERSES

LOGICAM/MS/004
